

## 大豆戸山正覚院 令和八年 年始のご挨拶

平素は 宗教法人正覚院 に 格別のお力添えを賜り 厚く御礼申し上げます  
さて 檉信徒の皆様のご理解とご協力のもと 昨年夏 龜山建設による  
『正覚院本堂屋根・瓦葺直し／床下基礎・扉工事』を執り行いました  
御存知の通り、当院の起源は安土桃山時代です

茅葺屋根の本堂から一九六一年（昭和三六年）改築し 六十余年を経て現代基準に  
則った修繕工事を行いました

工事中は何かとご不便をおかけいたしましたこと そして 何よりも当院の運営活動に  
ご理解とご協力を頂戴いたしましたことに 感謝申し上げます



龟山建設 HP


### 『正覚院本堂屋根・瓦葺直し／床下基礎・扉工事』ご報告

#### 1. 本堂床下修繕

[修繕前] 本堂の丸柱の沈下あった為、調査。

[修繕後] 丸柱をジャッキアップ、基礎を礎石からコンクリートに拡大し、柱の沈下を軽減しました

工事前

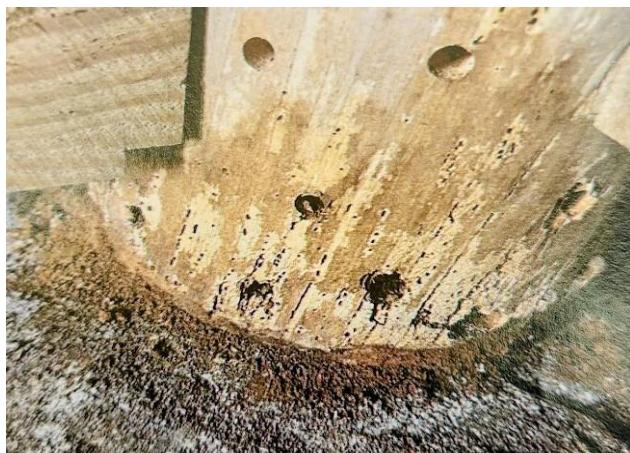

工事経過、工事後



本堂内陣下間側にある丸柱 2 本の基礎石をコンクリートで固め 基礎を拡大しました  
他、本堂外壁と本堂扉のひび補修 扉下不具合修繕 床下の東石移動 須弥壇側内壁塗喰  
塗直し など修繕を致しました

## 2. 本堂小屋


[修繕前] 本堂の須弥壇あたり屋根裏の横柱（小屋梁）のたわみあり 柱の不足を確認  
[修繕後] 内陣の梁・筋交い・支柱の補強や交換 小屋の全面的修繕を執り行いました

### 工事前



屋根内部の材木搬入（2回）

### 工事後

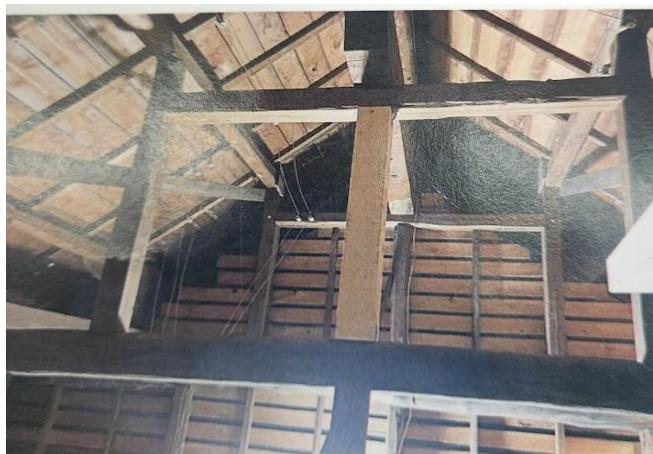

小屋束を足す



筋交いを入れる



柱木固定




梁の補強

### 3.本堂屋根・瓦葺直し

[修繕前] 瓦下屋根の腐食の確認・一部雨漏り・瓦葺替の必要を確認

[修繕後] 各部位の腐食具合に応じて 下地を直し 瓦の葺替えを執り行いました

#### 工事前

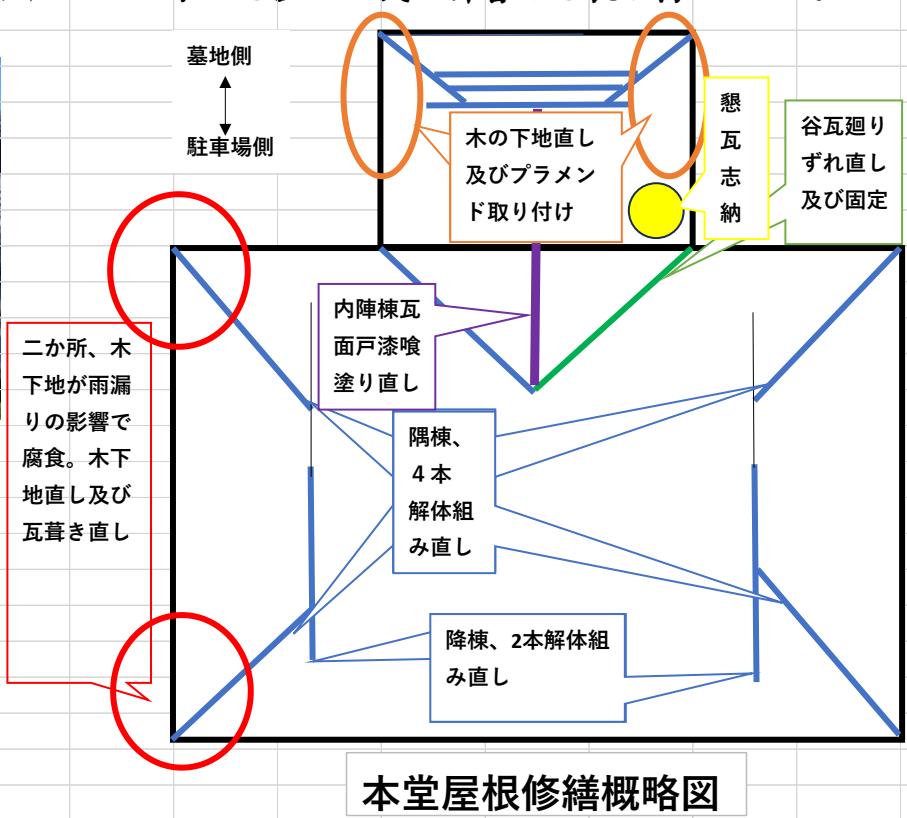

本堂屋根修繕概略図


#### 工事過程



隅棟解体



隅棟解体

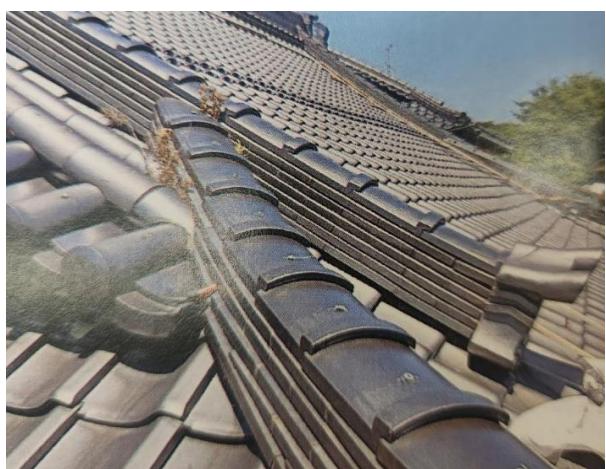

隅棟解体



隅棟解体

## 工事経過



屋根地



桟打ち



葺直し

読経供養ののちに瓦志納（計114枚）



すべてを画像ではご紹介できませんでしたが 上記の修繕工事を行いました  
正覚院のご本尊様をお守りできているのも 備に 近隣の方 様信徒の皆様の御信  
心とご協力の賜であり 平素より賜りますご厚情に 御礼申し上げます  
今後も永続的に正覚院をお守りすることを目指し 知恵を絞り 役員会議を重ねな  
がら運営を務めて参ります お見守りの程 宜しくお願ひ申し上げます

大豆戸山 正覚院
